



151 route des trois Lucs à la Valentine  
13011 MARSEILLE

Tél. : 04.91.21.62.33  
Fax : 04.91.21.62.34  
Email : alcyon\_marseille@yahoo.fr

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

RAPPORT DE REPERAGE **3884-0007 PLAGE DES CATALANS-1 / AMIANTE**  
**ALCOVES NORD**

ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE **23/12/2014**

### Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ».

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.

**Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.**

### Bien objet de la mission

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Adresse :                  | Rue des Catalans<br>13008 MARSEILLE |
| Partie de bien inspectée : | 9 alcôves au nord de la plage       |
| Date de visite :           | 15/12/2014                          |

Thomas DEVENOGES

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

## Sommaire

|    |                                                               |    |
|----|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Renseignements concernant la mission .....                    | 2  |
| 2. | Conclusions du rapport .....                                  | 4  |
| 3. | Description générale du bien et réalisation du repérage ..... | 7  |
| 4. | Résultats détaillés du repérage .....                         | 9  |
| 5. | Attestation sur l'honneur.....                                | 10 |
| 6. | Attestation d'assurance.....                                  | 11 |
| 7. | Certificat de compétences .....                               | 12 |
| 8. | Annexes.....                                                  | 13 |

## **1. Renseignements concernant la mission**

### **1.1 Désignation du bâtiment**

Type de bâtiment : Locaux divers  
Numéro (indice) : 3884-0007 Plage des Catalans (1)  
Date du permis de construire (à défaut date de construction) : Non communiqué  
Adresse complète : Rue des Catalans  
13008 MARSEILLE  
Référence cadastrale : Parcelle : Non Communiqué  
Bien en copropriété : Pas de copropriété

### **1.2 Désignation du client**

**Désignation du propriétaire :** Ville de Marseille

### **Désignation du donneur d'ordre :**

Nom : Direction de la Mer, du Littoral et du Nautisme  
Adresse : 16, rue Antoine-Zattara  
13332 Marseille Cedex 3

### **1.3 Désignation de l'opérateur de repérage**

Nom : Thomas DEVENOGES  
Email : alcyon\_marseille@yahoo.fr  
Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par I.Cert . Le N° du certificat est CPDI 2697 délivré le 19/05/2014 et expirant le 18/05/2019.

### **1.4 Organisme chargé de la mission**

Raison Sociale : Alcyon  
Adresse : 151 route des trois Lucs à la Valentine -13011 MARSEILLE  
Numéro SIRET : 419 035 381 00039  
Code NAF : 7112 B

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

N° TVA : FR 26 419 035 381  
N° RCS : 2001 B 01199  
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : LLOYD'S  
N° de police : RC 695J09U000/512  
Valide jusqu'au : 31/03/2015

## 1.5 Désignation du laboratoire d'analyse

Nom : ITGA Aix En Provence  
Adresse : Arteparc - Bâtiment E - Route de la côte d'Azur  
CS n° 30012  
13590 MEYREUIL

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-1029.

## 1.6 Avertissement et définition du champ de la mission

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

**Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)**

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe A1 de la norme NFX 46-020 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

### ▪ **Nature et périmètre des travaux envisagés :**

Le programme des travaux concerne la réfection des 9 alcôves Nord de la plage des Catalans.

### ▪ **Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :**

Plans

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmètre de repérage défini par le programme des travaux, doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

Si, à l'issue des travaux, des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés lors de la présente mission sont laissés en place, il est ici rappelé au propriétaire du bâtiment qu'il reste à leur égard tributaire des obligations réglementaires définies par le Code de la santé publique.

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

## 2. Conclusions du rapport

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Remarques particulières : Les alcôves 1 et 2 n'ont pas pu être visitées car fermées à clés. Un calorifugeage suspect avec son enveloppe a été repéré au niveau de l'alcôve 1 mais n'a pas été prélevé à la demande du donneur d'ordre (hors mission). Un conduit en fibro-ciment a été repéré dans l'alcôve 3 se prolongeant dans les 2 premières alcôves mais n'a pas été prélevé car inaccessible (cabines fermées). Les cabines fermées rendent inaccessibles les murs des alcôves.

### 2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

#### Après analyse en laboratoire :

| Description | Localisation | Prélèvement | Etat |
|-------------|--------------|-------------|------|
| Néant       |              |             |      |

#### Sur justificatifs (marquage, document consulté) :

| Description | Localisation | Nom justificatif | Etat |
|-------------|--------------|------------------|------|
| Néant       |              |                  |      |

### 2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

#### Sur justificatifs :

| Description | Localisation | Justification | Nom justificatif |
|-------------|--------------|---------------|------------------|
| Néant       |              |               |                  |

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

## Après analyse en laboratoire :

| Description                                                                               | Localisation | Prélèvement |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Façade/Enduit (Enduit rose + ciment + peinture jaune) [Hors annexe 13-9]                  | Alcôve 1     | n° 80465    |
| Mur/Enduit projeté                                                                        | Alcôve 1     | n° 80471    |
| Plafond/Enduit projeté (Enduit gris et jaune)                                             | Alcôve 3     | n° 80466    |
| Poutres/Peinture (Verte et grise sur poutres et poutrelles métallique) [Hors annexe 13-9] | Alcôve 3     | n° 80467    |
| Cloison/Panneau vissé (Partie basse)                                                      | Alcôve 4     | n° 80469    |
| Plafonds/Rebouchage [Hors annexe 13-9]                                                    | Alcôve 4     | n° 80468    |
| Cloison/Panneau vissé (Partie basse)                                                      | Alcôve 7     | n° 80470    |
| Façade/Enduit (Rouge) [Hors annexe 13-9]                                                  | Alcôve 9     | n° 80472    |

## Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :


| Description | Localisation |
|-------------|--------------|
| Néant       |              |

### 2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

| Description                                        | Localisation | Cause de non-prélèvement                                  |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Conduit d'autres fluides/Calorifugeage + enveloppe | Alcôve 1     | Hors mission. Non prélevé à la demande du donneur d'ordre |
| Conduit d'air/Conduit en fibres-ciment             | Alcôve 3     | inaccessible                                              |

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

## 2.4 Plans et photos de localisation des MPCA

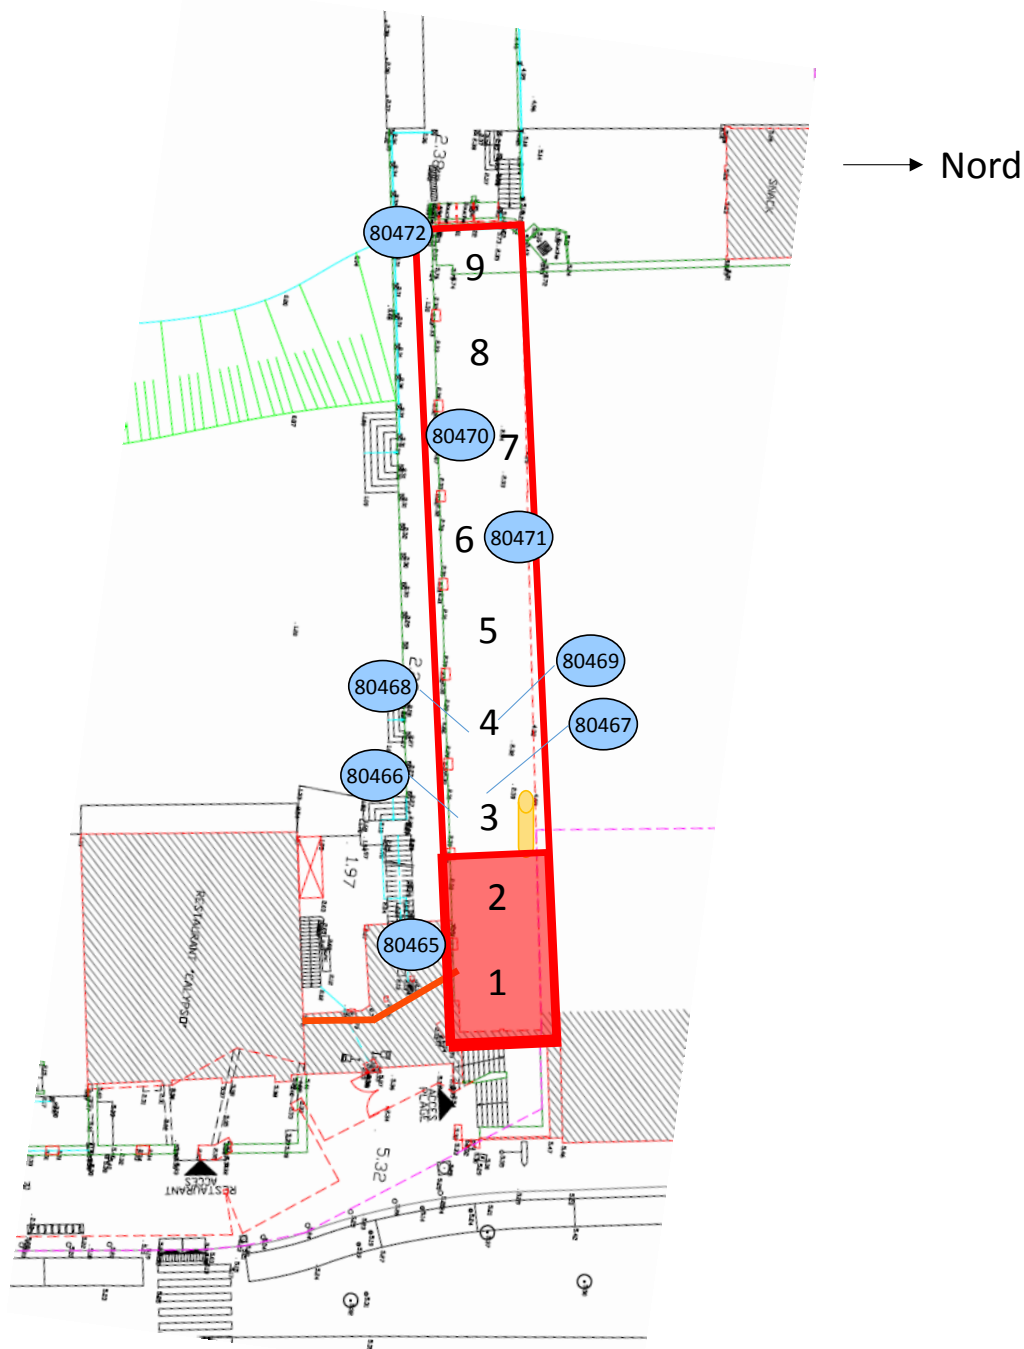

### Légende:

-  Prélèvement sans amiante (n° d'analyse).
-  Conduit suspect en fibro-ciment
-  Calorifugeage suspect + enveloppe suspecte
-  Zone de travaux
-  Locaux non visités. Fermés le jour de la visite

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux



Calorifugeage + enveloppe suspects  
Alcôve 1



Conduit fibro-ciment suspect  
Alcôve 3 vers alcôves 2

## 3. Description générale du bien et réalisation du repérage

Date du repérage 15/12/2014  
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage Plans  
Représentant du propriétaire (accompagnateur) M. Laurent SAINT AMAN

### 3.1 Liste des pièces visitées

Plage des Catalans : Alcôve 1, Alcôve 2, Alcôve 3, Alcôve 4, Alcôve 5, Alcôve 6, Alcôve 7, Alcôve 8, Alcôve 9

### 3.2 Tableau récapitulatif des pièces visitées

| Nom      | Descriptif |
|----------|------------|
| Alcôve 1 |            |
| Alcôve 2 |            |
| Alcôve 3 |            |
| Alcôve 4 |            |
| Alcôve 5 |            |
| Alcôve 6 |            |
| Alcôve 7 |            |
| Alcôve 8 |            |
| Alcôve 9 |            |

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

## 3.3 Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

| Pièces ou parties d'immeuble | Raison de l'absence de visite |
|------------------------------|-------------------------------|
| Alcôves 1 et 2               | Absence de clefs              |

## 3.5 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
  - les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
  - les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

## 4. Résultats détaillés du repérage

| Localisation | Composant de la construction (catégorie) | Partie du composant inspecté | Inspection                                          |                   | Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'Amiante |                               |      |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
|              |                                          |                              | Description                                         | Sondage N° (type) | Prélèvement                                                 | Conclusion                    | Etat |
| Alcôve 1     | Façade                                   | Enduit                       | Enduit rose + ciment + peinture jaune               | -                 | Oui : 80465                                                 | <b>Absence d'amiante</b>      |      |
| Alcôve 1     | Mur                                      | Enduit projeté               |                                                     | -                 | Oui : 80471                                                 | <b>Absence d'amiante</b>      |      |
| Alcôve 3     | Plafond                                  | Enduit projeté               | Enduit gris et jaune                                | -                 | Oui : 80466                                                 | <b>Absence d'amiante</b>      |      |
| Alcôve 3     | Poutres                                  | Peinture                     | Verte et grise sur poutres et poutrelles métallique | -                 | Oui : 80467                                                 | <b>Absence d'amiante</b>      |      |
| Alcôve 4     | Cloison                                  | Panneau vissé                | Partie basse                                        | -                 | Oui : 80469                                                 | <b>Absence d'amiante</b>      |      |
| Alcôve 4     | Plafonds                                 | Rebouchage                   |                                                     | -                 | Oui : 80468                                                 | <b>Absence d'amiante</b>      |      |
| Alcôve 7     | Cloison                                  | Panneau vissé                | Partie basse                                        | -                 | Oui : 80470                                                 | <b>Absence d'amiante</b>      |      |
| Alcôve 9     | Façade                                   | Enduit                       | Rouge                                               | -                 | Oui : 80472                                                 | <b>Absence d'amiante</b>      |      |
| Alcôve 1     | Conduit d'autres fluides                 | Calorifugeage                |                                                     | -                 | Prélèvement impossible dans les conditions actuelles        | <b>Impossible de conclure</b> |      |
| Alcôve 3     | Conduit d'air                            | Conduit en fibres-ciment     |                                                     | -                 | Prélèvement impossible dans les conditions actuelles        | <b>Impossible de conclure</b> |      |

**Observations :** Les alcôves 1 et 2 n'ont pas pu être visitées car fermées à clés. Un calorifugeage suspect avec son enveloppe a été repéré au niveau de l'alcôve 1 mais n'a pas été prélevé à la demande du donneur d'ordre (hors mission). Un conduit en fibro-ciment a été repéré dans l'alcôve 3 se prolongeant dans les 2 premières alcôves mais n'a pas été prélevé car inaccessible (cabines fermées). Les cabines fermées rendent inaccessibles les murs des alcôves.

### Cachet de l'opérateur



### Date de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le : 15/12/2014  
 par : Thomas DEVENOGES  
 Rapport édité le : 23/12/2014  
 à : MARSEILLE

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

## 5. Attestation sur l'honneur

Je, soussigné Thomas DEVENOGES, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.



# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

## 6. Attestation d'assurance



**EBA INSURANCE SERVICES**

Référence : 225586

**ATTESTATION D'ASSURANCES DE :**  
**RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE**  
**RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE**  
**RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION**

La période de validité de la présente attestation s'étend du 01/04/2014 jusqu'au 31/03/2015


**LE COVERHOLDER :**



**EBA Insurance Services**  
5-10 Bury Street  
London EC3A 5AT  
Royaume-Uni

Le Coverholder, agissant en vertu de l'autorisation résultant du pouvoir de souscription N° B11771300366A par certains souscripteurs du LLOYD'S dont les numéros et les pourcentages dans les risques garantis sont indiqués ci-dessous, atteste avoir délivré un contrat d'assurance au souscripteur désigné ci-dessous.

**LES ASSUREURS :**



**Souscrit à 100% au Lloyd's de Londres.**  
(Association d'assureurs à statut spécial, régie en France par le Code des Assurances, et contrôlée à Londres par la FSA)  
Le Mandataire Général des Souscripteurs du Lloyd's pour leurs opérations en France et à Monaco:  
LLOYD'S FRANCE S.A.S, 8-10 rue Lamennais, 75008 PARIS.  
Numéro et pourcentages de participation des syndicats du Lloyd's : 50% syndicat 2987 BRT, 50% syndicat 1919 CVS. En cas de pluralité de syndicats, chaque syndicat s'engage pour sa part, sans solidarité entre syndicats.

**LE SOUSCRIPTEUR :**

Nom: ALCYON  
Adresse: 151 Route Des Trois Lucs a la Valentine  
13011 MARSEILLE  
FRANCE

A souscrit un contrat d'assurance sous le N° de police : RC695J09U000/512

**OBJET DE LA GARANTIE :**

Couvrir les conséquences pécuniaires des responsabilités :

- civile professionnelle (contractuelle et quasi-délictuelle) de droit commun (article 1101 du Code Civil et suivants et 1382 du Code Civil et suivants).
- décennale conformément aux obligations définies à l'article L 241-1 et L 241-2 du Code des Assurances pour les dommages de la nature de ceux prévus aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil.
- civile d'exploitation pour dommages causés aux tiers par l'Assuré dans le cadre des activités professionnelles et dans les limites territoriales précisées dans les Conditions Particulières.

**PÉRIODE DE GARANTIE :**

- Du 01/04/2014 au 31/03/2015 pour la responsabilité civile professionnelle et d'exploitation en "Base Réclamation" conformément aux dispositions de l'article L 124-5 alinéas 4 et 5 du Code des Assurances.
- La garantie obligatoire de la responsabilité décennale est accordée pour la durée de dix ans à compter de la réception visée à l'article 1792-4-1 du Code Civil, pour les chantiers ouverts entre le 01/04/2014 et le 31/03/2015
- Échéance annuelle au 01 Avril de chaque année.
- Contrat à tacite reconduction.

EBA INSURANCE SERVICES  
5-10 Bury Street, 5th Floor, LONDON, EC3A 5AT  
t:+44(0)20 7929 7711 f:+44(0)20 7929 7733 e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com  
Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority, FRN 307412

RC695J09U000/512

Page 1 de 3

Document émis le 05/08/2014

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

## 7. Certificat de compétences



**CERTIFICAT DE COMPETENCES**  
**DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER**

N° CPDI 2697 Version02

Je soussigné  
Philippe TROYAUX,  
Directeur Général d'I.Cert,  
atteste que :

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amiante | <b>Monsieur Thomas DEVENOGES</b><br><br>Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes I.Cert pour la réalisation des missions suivantes :<br><br><b>Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis</b><br>Date d'effet : 19/05/2014, date d'expiration : 18/05/2019 |
| Plomb   | <b>Plomb: Constat du risque d'exposition au plomb</b><br>Date d'effet : 29/04/2014, date d'expiration : 28/04/2019                                                                                                                                                                                               |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire  
Le 30/06/2014





Certification de personnes  
Diagnostic  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc EDONIA - Bât G  
Rue de la Terre Victoria  
35760 Saint Grégoire  
CPE DIFR 11 rev 09

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 7/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011



ACCREDITATION  
N° 4-0522  
PORTÉE D'ISOULES SUR  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

## 8. Annexes

### Résultats d'analyses



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

### RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-11932 EN DATE DU 23/12/2014 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

Société ALCYON  
M. Thomas DEVENOGES  
151 route des Trois Lucs à la Valentine  
13011 MARSEILLE

#### Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 18/12/2014  
Analysé à : ITGA Meyreuil

#### Réf. Client :

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Commande       | 1445-3884-0007                                              |
| Echantillon    | 80465 - Enduit rose + ciment + peinture<br>jaune - Alcove 1 |
| Dossier client |                                                             |

#### Réf. ITGA :

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Commande         | IT0414-32423              |
| Echantillon      | IT041412-11932            |
| Description ITGA | Enduit gris avec peinture |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération  
des poussières sur grille de microscope électronique

#### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

| Fraction Analysée         | Technique analytique<br>et date d'analyse | Résultat            | Type<br>d'amiante | Nb de<br>Prépas |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Enduit gris avec peinture | META le 22/12/2014                        | Amiante non détecté | ---               | 1               |

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

## RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-11946 EN DATE DU 23/12/2014 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

Société ALCYON  
M. Thomas DEVENOGES  
151 route des Trois Lucs à la Valentine  
13011 MARSEILLE

### Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 18/12/2014  
Analysé à : ITGA Meyreuil

### Réf. Client :

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Commande       | 1445-3884-0007                                          |
| Echantillon    | 80466 - Enduit plafond voutain gris et jaune - Alcove 3 |
| Dossier client |                                                         |

### Réf. ITGA :

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Commande         | IT0414-32423              |
| Echantillon      | IT041412-11946            |
| Description ITGA | Enduit gris avec peinture |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée         | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de Prépas |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Enduit gris avec peinture | META le 22/12/2014                     | Amiante non détecté | ---            | 1            |

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029  
Liste des sites et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

## RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-11947 EN DATE DU 23/12/2014 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

Société ALCYON  
M. Thomas DEVENOGES  
151 route des Trois Lucs à la Valentine  
13011 MARSEILLE

### Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 18/12/2014  
Analysé à : ITGA Meyreuil

### Réf. Client :

### Réf. ITGA :

|                |                                                                   |                  |                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Commande       | 1445-3884-0007                                                    | Commande         | IT0414-32423       |
| Echantillon    | 80467 c- Peinture poutres et poutrelles grise et verte - Alcove 3 | Echantillon      | IT041412-11947     |
| Dossier client |                                                                   | Description ITGA | Eclats de peinture |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée  | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de Prépas |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Eclats de peinture | META le 22/12/2014                     | Amiante non détecté | ---            | 1            |

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

## RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-11948 EN DATE DU 23/12/2014 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

Société ALCYON  
M. Thomas DEVENOGES  
151 route des Trois Lucs à la Valentine  
13011 MARSEILLE

### Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 18/12/2014  
Analysé à : ITGA Meyreuil

### Réf. Client :

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Commande       | 1445-3884-0007                |
| Echantillon    | 80468 - Rebouchage - Alcove 4 |
| Dossier client |                               |

### Réf. ITGA :

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Commande         | IT0414-32423                        |
| Echantillon      | IT041412-11948                      |
| Description ITGA | Matériau gris compact avec peinture |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée                   | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de Prépas |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Matériau gris compact avec peinture | META le 23/12/2014                     | Amiante non détecté | ---            | 2            |

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029  
Liste des sites et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

## RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-11950 EN DATE DU 23/12/2014 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

Société ALCYON  
M. Thomas DEVENOGES  
151 route des Trois Lucs à la Valentine  
13011 MARSEILLE

### Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 18/12/2014  
Analysé à : ITGA Meyreuil

### Réf. Client :

### Réf. ITGA :

|                |                                        |                  |                                      |
|----------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Commande       | 1445-3884-0007                         | Commande         | IT0414-32423                         |
| Echantillon    | 80469 - Plaqu cloison basse - Alcove 4 | Echantillon      | IT041412-11950                       |
| Dossier client |                                        | Description ITGA | Matériau blanc compact avec peinture |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée                    | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de Prépas |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Matériau blanc compact avec peinture | META le 23/12/2014                     | Amiante non détecté | ---            | 3            |

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029  
Liste des sites et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

## RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-11951 EN DATE DU 23/12/2014 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

Société ALCYON  
M. Thomas DEVENOGES  
151 route des Trois Lucs à la Valentine  
13011 MARSEILLE

### Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 18/12/2014  
Analysé à : ITGA Meyreuil

### Réf. Client :

### Réf. ITGA :

|                |                                   |                  |                                         |
|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Commande       | 1445-3884-0007                    | Commande         | IT0414-32423                            |
| Echantillon    | 80470 - Plaque cloison - Alcove 7 | Echantillon      | IT041412-11951                          |
| Dossier client |                                   | Description ITGA | Panneau de bois aggloméré avec peinture |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée                       | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de Prépas |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Panneau de bois aggloméré avec peinture | META le 22/12/2014                     | Amiante non détecté | ---            | 1            |

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

## RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-11952 EN DATE DU 23/12/2014 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

Société ALCYON  
M. Thomas DEVENOGES  
151 route des Trois Lucs à la Valentine  
13011 MARSEILLE

### Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 18/12/2014  
Analysé à : ITGA Meyreuil

### Réf. Client :

### Réf. ITGA :

|                |                               |                  |                           |
|----------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|
| Commande       | 1445-3884-0007                | Commande         | IT0414-32423              |
| Echantillon    | 80471 - Enduit mural - Alcove | Echantillon      | IT041412-11952            |
| Dossier client |                               | Description ITGA | Enduit gris avec peinture |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée         | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de Prépas |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Enduit gris avec peinture | META le 22/12/2014                     | Amiante non détecté | ---            | 1            |

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029  
Liste des sites et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

## RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-11953 EN DATE DU 23/12/2014 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

Société ALCYON  
M. Thomas DEVENOGES  
151 route des Trois Lucs à la Valentine  
13011 MARSEILLE

### Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 18/12/2014  
Analysé à : ITGA Meyreuil

### Réf. Client :

### Réf. ITGA :

|                |                                           |                  |                            |
|----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Commande       | 1445-3884-0007                            | Commande         | IT0414-32423               |
| Echantillon    | 80472 - Enduit de façade rouge - Alcove 9 | Echantillon      | IT041412-11953             |
| Dossier client |                                           | Description ITGA | Enduit beige avec peinture |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée          | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de Prépas |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Enduit beige avec peinture | META le 22/12/2014                     | Amiante non détecté | ---            | 1            |

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire
